



# Fv. 119 Sykkelfelt Melløs – i samspill med andre planer.

Miljøløftet Moss 5.mars 2021  
Ina Abrahamsen



Statens vegvesen

# Bakgrunn

PLAN  
FOR HOVEDNETT  
FOR SYKKELTRAFIKK  
MOSS/RYGGE



2019-2028



# Status pr februar 2021





## Bakgrunn

- Statens vegvesen stilte spørsmålstegn om den foreslåtte løsningen (sykkelfelt) var den beste løsningen med tanke på videreføring av sykkeltiltaket mot sentrum, og med tanke på trafikksikkerheten.
- I nordre ende (mot sentrum), ville sykkelfeltene ha stoppet i krysset med Dyreveien.
- Styringsgruppen ønsket orientering om hvordan tiltaket henger sammen med andre planer for sykkel i området.
- Det har vært flere møter mellom Moss kommune, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen om dette prosjektet.
- Den 12.januar i år, ble det enighet om at ny løsning, sykkelveg med fortau, er en løsning som er god for denne strekningen.



# Prosjekt - 2021


Ferdigstilles 2. kvartal 2021 (Moss kommune)

Fv. 119- sykkeløsning -  
reguleringsplan under  
arbeid (Statens vegvesen)






# Sykkelprosjekt – Fridtjof Nansens gate

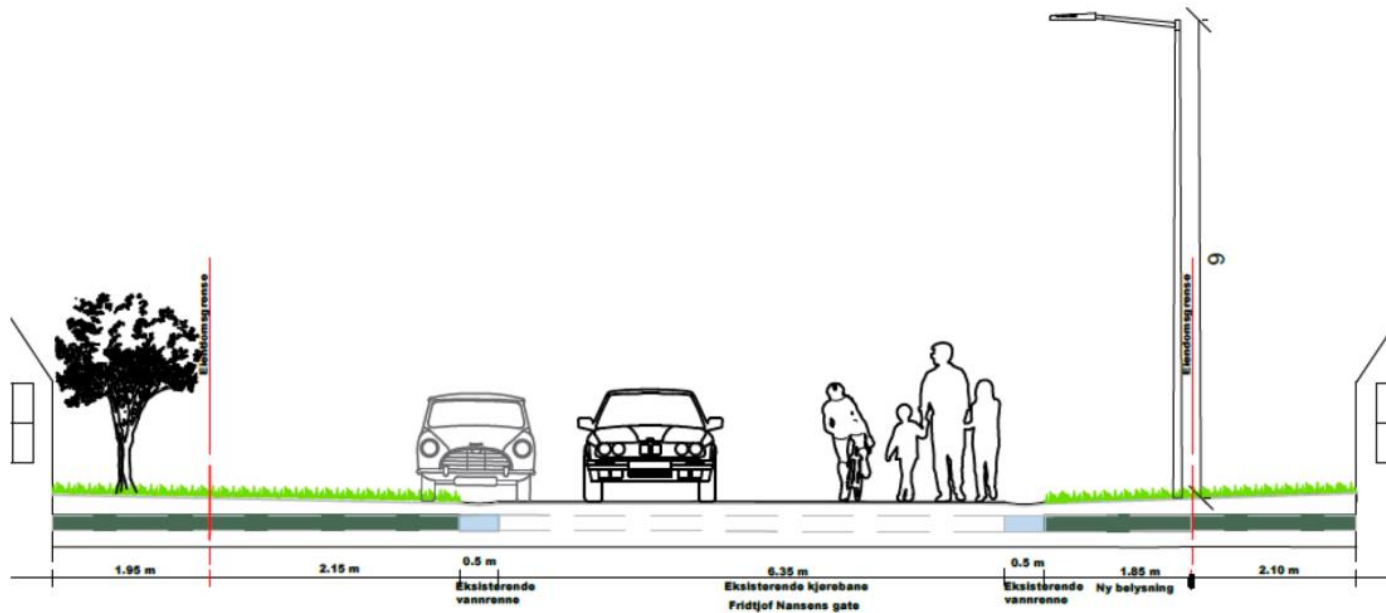


## Fv. 119 Sykkelanlegg Melløs

Det er benyttet tre forskjellige normalprofiler på strekningen. Dette pga. varierende bredder på tilgjengelig areal.

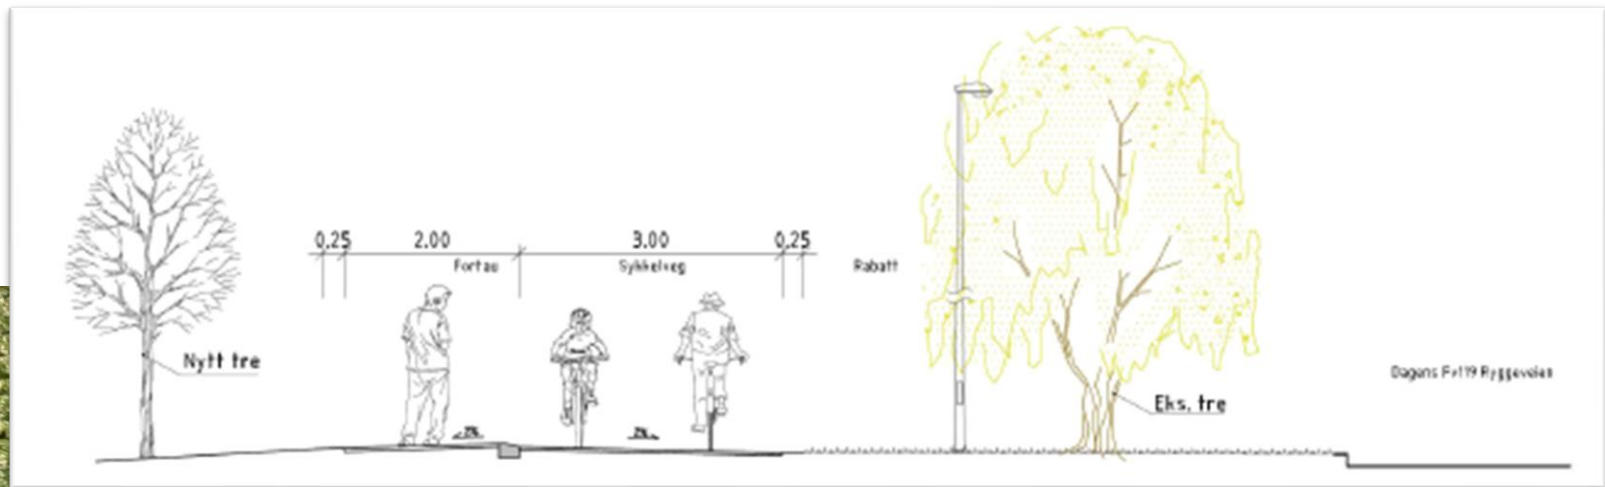

# Fv. 119 Sykkelanlegg Melløs

## Normalprofil 2 (Forbi Furuholtet)

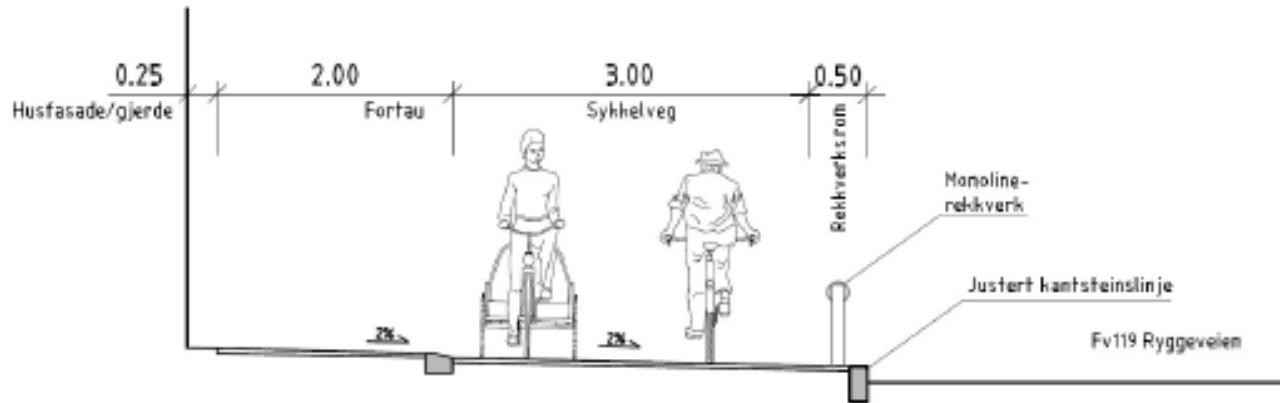


Alternativ uten rekkverk



# Fv. 119 Sykkelanlegg Melløs

## Normalprofil 3 (Furuholtet – Dyreveien)

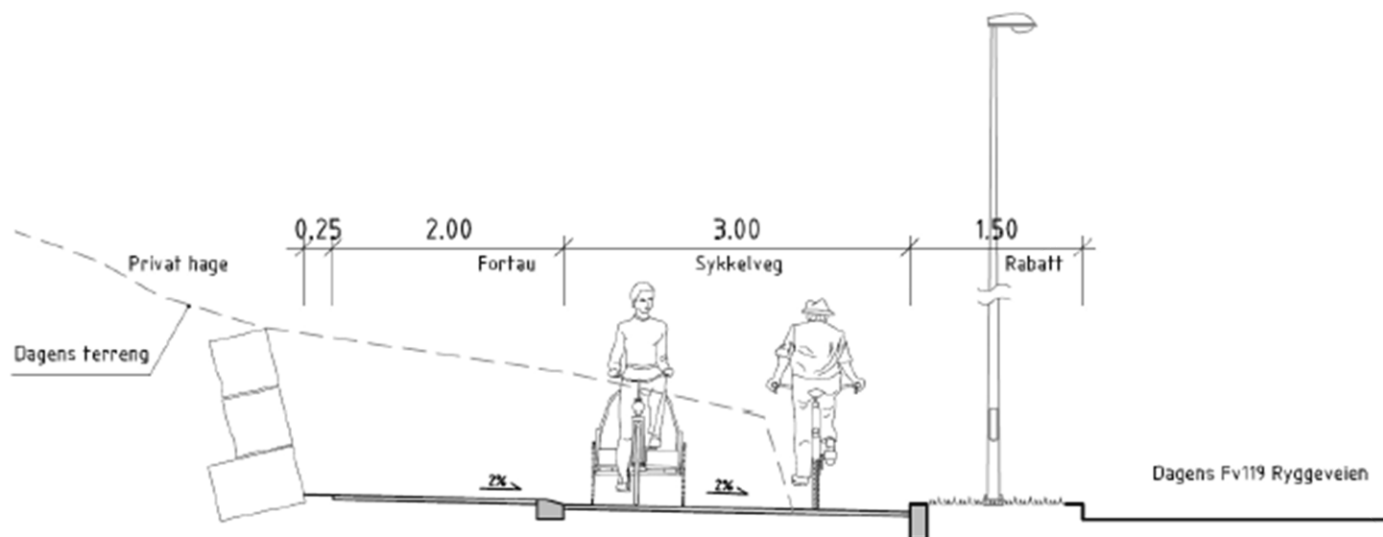

# Fremdriftsplan sykkelanlegg fv. 119 Melløs



Statens vegvesen

Leveranse/aktivitet	Ansvar	Tidsfrist	Utført	Kommentar
Utarbeide skisser og notat	Multiconsult	november	100 %	
Utarbeide skisser av kryss	Multiconsult	desember	100 %	
Forankring av ny løsning hos kommunen og Viken	SVV	des/jan	100 %	
Varsle om utvidet planområde	SVV	januar	100 %	
Utarbeide og signere endringsordrer for ny løsning	Multiconsult og SVV	des/jan	100 %	Har signert 3 av 3 endringer
Bemanne prosjektet med fagressurser fra SVV	SVV	januar	100 %	vegplanlegger/VA, landskap, grunnnerv
Drøftingsmøter teknisk plan	Multiconsult og SVV	Februar	100 %	Kommunen og Viken har deltatt på 1 møte
Teknisk plan	Multiconsult	Februar	ca 80%	
Anslag	Multiconsult, men prisgivere fra SVV	25.mar		Innkalling har blitt sendt ut
TS-revisjon	SVV	Mars		
Planbeskrivelse	Multiconsult	Mars		
Plankart og bestemmelser	Multiconsult	Mars		
Ros-analyse	Multiconsult	Mars		
Nytt offentlig ettersyn	SVV	April-mai		
Merknadsbehandling og utarbeidelse av merknadsrapport	SVV	Juni		
Sommerferie	Multiconsult og SVV	juli		
Eventuelle justeringer av plandokumenter som følge av merknadsbehandlingen	Multiconsult og SVV	August		
Oversendelse til sluttbehandling i Moss kommune	SVV	Aug/sept		
Planvedtak	Kommunen	Okt/nov		
